



**DÉCIMA ACTA DE SESIÓN 2025.
DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA
22 DE OCTUBRE DE 2025
COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco, siendo las 13:58 trece horas con cincuenta y ocho minutos del 22 de octubre de 2025, en el Sala de Regidores del Honorable Ayuntamiento y en apego a lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; 39 numeral 15, artículos 40, 41, 44, 45, 47 y 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco; conformado por CC. **DEYSI NALLELY ÁNGEL HERNÁNDEZ, IGNACIO GOMEZ ORNELAS, BERTHA ALICIA CASTELLANOS SALCEDO, ROGELIO GARCIA CASTRO**, Presidenta y vocales respectivamente, tienen a bien llevar a cabo la **DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA**, La cual siguió su curso de la siguiente manera:-----

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO: La C. **Deysi Nallely Ángel Hernández**, presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del primer punto del orden del día, **LECTURA A LA LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL**; la cual resultó de la siguiente forma:

No.	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
1	C. Ignacio Gómez Ornelas	Vocal	Ausente
2	C. Edwin Gilberto Fonseca Torres	Vocal	Presente
3	C. Bertha Alicia Castellanos Salcedo	Vocal	Presente
4	C. Rogelio García Castro	Vocal	Presente

PÁGINA 1 DE 12

LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027

5	C. Deysi Nallely Ángel Hernández	Presidenta	Presente
---	----------------------------------	------------	----------

La C. Deysi Nallely Ángel Hernández: Presidenta de la comisión informo que conforme lo establecido en el artículo 45 del reglamento de organización y funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, se da cuenta de 04 de los 05 integrantes que conforman la comisión edilicia, por lo tanto informo de la **EXISTENCIA QUORUM LEGAL** para llevar a cabo el desahogo de la misma, declaro que son válidos los acuerdos que se tomen en ella. -----

C. Deysi Nallely Ángel Hernández. - Antes de continuar con el orden del día, quiero agradecer la presencia de la Regidoras Ana María Chapa Garza y Marisol Villa Nápoles que hoy se dan cita gracias Ana María Chapa Garza y Marisol Villa Nápoles por tener el interés de acompañarnos en esta Comisión Edilicia. También nos acompaña el Regidor Cristian Daniel Salas Bravo y la Regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez que se van a incorporar como invitada de esta Comisión Edilicia de Obras Públicas. Gracias por el interés a los cuatro de acompañarnos en esta Comisión Edilicia. -----

SEGUNDO PUNTO. - La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del segundo punto del día, **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DISPENSA DE LOS DOCUMENTOS PREVIAMENTE ENTREGADOS.** -----

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día y dispensa de los documentos previamente entregados.
3. Aprobación del contenido del acta de la comisión edilicia de Obra Pública de fecha 08 de septiembre de 2025.

PÁGINA 2 DE 12

LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027

4. Informe de las obras que se encuentran en proceso de ejecución presentado por la Dirección de Obra Pública.
5. Asuntos varios.
6. Clausura de la sesión.

Está a consideración el orden del día, ¿si alguien tiene alguna observación o modificación?

No existiendo ninguna, solicito en votación económica quien esté a favor, lo manifiesten levantando su mano

No.	NOMBRE	CARGO	SENTIDO DEL VOTO
1	C. Bertha Alicia Castellanos Salcedo	Vocal	A favor
2	C. Rogelio García Castro	Vocal	A favor
3	c. Edwin Gilberto Fonseca Torres	Vocal	A favor
4	C. Deysi Nallely Ángel Hernández	Presidenta	A favor
RESULTADO DE LA VOTACIÓN			
Votos a favor: 04			
Votos en contra: 0			
Abstención: 0			

La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con 04 votos a favor de los 04 integrantes presentes.-----

TERCER PUNTO: La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del tercer punto del día, **APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, Con fundamento en el artículo 23 inciso b del reglamento de organización y

PÁGINA 3 DE 12
LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027

funcionamiento del ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco se pone a consideración el contenido del acta anterior, por lo que sí es de aprobarse pido a los presentes manifestarlo levantando su mano. Como es el acta anterior solicito solo la votación de los de la comisión de hacienda y recaudación. -----

No.	NOMBRE	CARGO	SENTIDO DEL VOTO
1	C. Bertha Alicia Castellanos Salcedo	Vocal	A favor
2	C. Rogelio García Castro	Vocal	A favor
3	c. Edwin Gilberto Fonseca Torres	Vocal	A favor
4	C. Deysi Nallely Ángel Hernández	Presidenta	A favor
RESULTADO DE LA VOTACIÓN			
Votos a favor: 04			
Votos en contra: 0			
Abstención: 0			

La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con 04 votos a favor de los 04 integrantes presentes. -----

CUARTO PUNTO: La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del cuarto punto del día; Informe de las obras que se encuentran en proceso de ejecución presentado por la Dirección de Obra Pública.

C. Deysi Nallely Ángel Hernández. - hoy nos acompaña el arquitecto Salvador Alvizo Lozano, a quien agradezco su presencia, por lo que pregunto si es de autorizarse el uso de la voz y así nos pueda rendir informe, pido a los regidores presentes manifestarlo levantando su mano. -

PÁGINA 4 DE 12
LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA
LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025
OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027

No.	NOMBRE	CARGO	SENTIDO DEL VOTO
1	C. Bertha Alicia Castellanos Salcedo	Vocal	A favor
2	C. Rogelio García Castro	Vocal	A favor
3	c. Edwin Gilberto Fonseca Torres	Vocal	A favor
4	C. Deysi Nallely Ángel Hernández	Presidenta	A favor
RESULTADO DE LA VOTACIÓN			
Votos a favor: 04			
Votos en contra: 0			
Abstención: 0			

*La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; Lo que resulta **APROBADO POR UNANIMIDAD** con 04 votos a favor de los 04 integrantes presentes. -----*

C. Arquitecto Salvador Alvizo Lozano. - Gracias, muchas gracias. Tenemos obras ahorita en proceso con avances, algunas que están iniciando y otras que ya tenemos con un buen avance. La construcción de un pavimento hidráulico en la calle Lerma es una obra en la cual los vecinos aportan el 30%. Tenemos que tener un avance del 10%. Estamos en el proceso de re nivelar con material de banco. Se abrió caja para retirar la arcilla y ahorita está relleno con un material bueno para poder observar a los vecinos. Tenemos regulaciones de bacheo. Estamos al 90% del contrato que se tenía ya hecho. La pavimentación de la calle Avenida del Fuerte es una calle que está ahorita en el 0%. Ya se hizo el contrato correspondiente para poder ponerle carpeta asfáltica. Se está terminando de sustituir con material bueno también, lo que es la base de la estructura del pavimento. La rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle Sócrates en frente del cuchi, hay una ampliación de metas hacia la calle Confucio en virtud que habíamos considerado de acuerdo con el estudio de laboratorio para sustituir la capa. También para mejorar la capa que teníamos abajo donde se va a poner la carpeta asfáltica. En una parte los sondeos que se hacen, uno aquí y otro por acá, pero en una parte no se dio bien

PÁGINA 5 DE 12

LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027

con base hidráulica. Lo cual nos dio como resultado un ahorro y ampliamos metas hacia la calle Confucio. Levantando el acta correspondiente en la bitácora para que a esa ampliación de metas de alrededor de 550.000 pesos sea el ahorro que tuvimos por no sustituir material que ya existía. Y ya está prácticamente al 90%. La carpeta asfáltica de la carretera de la labor vieja que llega ya tenemos un 7%. Ya están trabajando las máquinas en lo que es ya el fresado para poder hacer la escarificación. Aquí hago un punto de que muchos han estado solicitando en las comunidades el material. El material va a ser aprovechado también para poder mezclarlo con la base que ya existe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fresar. Vamos a escarificar. La escarificada es la máquina que nos levanta también parte de la base hidráulica que tenemos abajo del asfaltado. Y el material que no esté tan contaminado lo vamos a aprovechar para mezclarlo dentro de la base hidráulica. Le vamos a agregar óxido de cal. Volver a compactar. Y vamos a colocar una capa de 15 centímetros más de base para subir los niveles y protegerla más de las humedades que tenemos en la zona. Este es el proceso que vamos a hacer. El material del resacado va a ver muy poco para poder utilizarlo. Ya asignamos un banco de préstamo donde se va a estar depositado aquel material que para el fin del carretero no funciona, pero que sí nos puede servir para la comunidad alta y cercana pre-nivelar. Pero va a ser poco, no va a ser mucho lo que se obtiene por el desgaste que tiene el carretero. Traemos la revisión de pavimentación hidráulica calle Efraín Gonzales luna un crucero que se estuvo trabajando con asfalto en varias ocasiones lo tengo que decir pero como hay mucha humedad y se concentra mucho en esos sitios donde recubren las aguas, pues el asfalto no nos dura. Entonces la presión tuvo bien que establecer también con concreto hidráulico ese punto que está pegado anexo a la federal. Ahí igual vamos a ampliar un poquito más hacia la federal. Ahorita lo que andamos viendo es retirar los obstáculos que nos pusieron en el tope que son los que se ocasionan que se estanque el agua. Nosotros tenemos pasos laterales, pero la gente, o los mismos cerca de ahí fueron porque las motos agarran la parte que no quedó con el tope, pero me estaban destruyendo

PÁGINA 6 DE 12

LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027

el agua para que circule, por eso es que se llena ahí en un lugar. Estaban 85% de avance físico. La revisión del mercado público de Morelos, que fue una obra que se va a retirar la cubierta y la celosía también se van a cambiar. Ya tenemos un 18% del avance. Están colocando las llanurillas y pintando y rehabilitando la estructura existente. La red de agua potable, de la colonia lázaro cárdenas, que hoy lo visitaron por ahí en la calle Guillermo Cosío Vidaurri la calle es agua y drenaje, ya arrancó. Tenemos un 5% ya de avance. La base de bomberos, vamos a reivindicar la base 1 de bomberos para dignificar el área de los sanitarios y vestidores y dormitorios. Estamos la próxima semana listos para arrancar ya fue contratada la obra. Tenemos la intervención urbana del camión de ingreso norte avenida de la universidad. Ya se está trabajando, tenemos un 10% de avance. Vamos a hacer unas adecuaciones en lo que es el camellón. Hay ahí una vuelta, precisamente, que nos sirve para retorno. Sin embargo, el no tener las colas de calmar y el machuelo que representa para indicar que es vuelta nos ha deteriorado el machuelo que existía. Si ustedes en alguna ocasión vieron, estaba ya dañado. Lo que ahora vamos a hacer es prolongar lo que es el machuelo, hacerle una colita de calmar que es la que nos indica que es un retorno y aprovechando en esa adecuación, vamos a construir una plazoleta en la cual se va a colocar la silla, que es una silla monumental de 4m x 4m x 8m de altura. Es una silla que fue elaborada con puras sillas, no hay impresión, está elaborada con puras sillas la silla y se va a poner como un emblema de ingreso a nuestra ciudad. La red de agua potable entubada para la dotación de agua, de lo que Xoconostle, ya está al 95%. Ahorita, teóricamente, estamos ya conectando, interconectando las cajas valuó existentes nuevas y revisando las líneas existentes porque la mayoría son mangueras y a la hora de meterle presión puede provocar que nos vayamos a enterrar. Entonces, estamos programando para el 2026 sustitución de algunas líneas internas ya de la población para poder alimentarla. Y tenemos la construcción de la búsqueda de tormenta en el cruce del Pino y Cerezo en la colonia de primavera, un lugar que por años se ha inundado ahí en la primavera, es donde tenemos ya un colector pluvial y ahorita se está

PÁGINA 7 DE 12

LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027

haciendo ya la caja receptora de las aguas precisamente para conectarlas a ese colector pluvial. Es una obra de nueve metros por nueve metros, es muy grande, es lo que se está ahí trabajando. Ya está el 90% de avance físico ya es algo de avance. -----

- C. Deysi Nallely Ángel Hernández. - No sé si alguien quiera comentar respecto al uso de la voz del síndico municipal. Antes de eso, quiero darle la bienvenida al regidor Ignacio Gómez Ornelas que se incorpora a esta comisión y ahora sí el suelo del síndico municipal.

- C. Rogelio García Castro. - Solamente tengo para comentarle el tramo, que se va a reparar de la carretera labor vieja hasta donde entronca lo que viene la tuna. -----

- C. Arquitecto Salvador Alvizo Lozano. - Es correcto, es de San Vicente la labor vieja hasta al tronque de la tuna y rancho viejo. -----

-C. Rogelio García Castro. - Pero no va hacer hasta rancho viejo. -----

-C. Arquitecto Salvador Alvizo Lozano. - No, rancho viejo se procedió a su bacheo si bien vieron la última vez que visitamos, ya se proceden entre 14 o 15 baches, ya se logró hacer ese trabajo. Ahí tenemos contemplada una glorieta que estaba ahorita en proceso de autorización con la Secretaría de Futuro de Obra Pública a través de su oficina de carreteras y lo estamos programando también para 2026. Es importante ahí contar para poder ahora sí detener el flujo de los vehículos, tanto de todos lados como del otro, y que pueda evitar accidentes. -----

-C. Rogelio García Castro. - ¿Qué pesor vamos a meter en la carpeta? -----

- C. Arquitecto Salvador Alvizo Lozano. - Son 6.5 cm. Ya con Pacto nos han trabajado casi 5.8 cm con Pacto. Ahí vamos como les dije al inicio, garantizar con la estructura que va abajo de la carpeta, garantizar toda su realidad. -----

-C. Rogelio García Castro. - ¿Y qué longitud mide el tramo? -----

- C. Arquitecto Salvador Alvizo Lozano. - El tramo alrededor son casi 2 kilómetros lo que tenemos hay. En cuanto acá, se va a colocar la plazoleta en lo que ya está el perímetro que está demarcado y ya con el machuelo. Lo que está levantado ahorita, que lo podemos mostrar, es un machuelo es una plazoleta va una gorrita pequeña dentro del camión. La

queríamos hacer fuera, pero eso implicaba que hacíamos carriles laterales, que no lo tenía la Secretaría de Futuro de la República previsto. Entonces decidimos ya hacer en el camión lo que es la parte más ancha del camión y le vamos a hacer una plazoleta de alrededor, son 12 metros más de plazoleta sobre la glorieta que es donde se va a colocar la silla.-----

-C. Deysi Nallely Ángel Hernández. – ¿Alguien más que quiera el uso de la voz? Primero la regidora Marisol Villa Nápoles y después la regidora Bertha Alicia Castellanos Salcedo. -

- C. Marisol Villa Nápoles. – Nada más comentarle lo que mencionaba respecto al bacheo ahorita que ya se esta yendo el temporal de lluvias se va a poder continuar por que me decía ahí que ya llevamos el 90% de donde era el total y ahorita que ya se va el temporal de lluvias nos están quedando pues muchísimos baches por la lluvia en toda la ciudad no sé qué medidas tenga considerado tomar.-----

- C. Arquitecto Salvador Alvizo Lozano. – Gracias. Se nos ha dado instrucciones por parte de la presente de la cuadrilla permanente de bacheo. Ahorita vamos a salir el año con lo que tenemos, dado que hubo algunos ajustes del personal también, pero está prevista una cuadrilla total de bacheo permanente para el 2026. Sin embargo, ahorita seguimos trabajando con la cuadrilla que traemos. Ahorita la móvil de rancho viejo, estamos haciendo una rehabilitación de al lado aquí, en la parte del rancho viejo. Una comunidad que también nos había atendido y se tuvo que invitar a que se haga eso, pero a la vez que ya tenemos material para continuar con el bacheo. Con la cuadrilla de nosotros y completar con el contrato que ya se había hecho. -----

-C. Bertha Alicia Castellanos Salcedo. - Hola, buenas tardes. ¿Ese bacheo se va a hacer aquí dentro de la ciudad o el permanente que tenemos o va hacer en alguna comunidad?-

-C. Arquitecto Salvador Alvizo Lozano. – El bacheo la cuadrilla de bacheo permanente va a arrancar las comunidades también, en el tiempo que tenemos. Tanto la zona centro, las colonias, y también las comunidades. -----

-C. Bertha Alicia Castellanos Salcedo. - Respecto a la manguera que dijo que se estaba

PÁGINA 9 DE 12

LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027

poniendo, que iba a ser necesario cambiarla, ¿por qué otro material se sustituyó? -----

-C. Arquitecto Salvador Alvizo Lozano. – Es tubería hidráulica R-26 del PBC, para que pueda soportar la presión de lo que es ahora que le vamos a instalar el agua de pronto. -

-C. Deysi Nallely Ángel Hernández. – Alguien más. -----

-C. Arquitecto Salvador Alvizo Lozano. – Tengo otros comentarios. Tengo que informar que las gestiones que nuestra presidenta ha realizado con agua, ya rindieron frutos, el día de hoy ya están dados los fallos de la reparación del tan soñado colector Soriana, que por años tiene mucho tiempo fracturado. Se va a iniciar la obra, así como el colector Galeana, que nos va a venir a solucionar los problemas que tenemos ahorita en la zona centro, que hemos visto, por Madero, nos acompañó por allá a un recorrido, Madero, 1910, Galeana y Luis Moya, etcétera, hay varios, pero ya está a punto de iniciar, ya me arregló con las agentes de Conagua, el día de hoy me enviaron quienes van a ser los supervisores de esa obra por parte de la Conagua, para que nos veremos igual en otras partes del municipio también, quienes van a estar al frente. Son obras muy importantes, son obras de alrededor de 30 a 35 millones de pesos, ¿por qué? Porque se va a hacer bidireccional, que es por abajo, se va a ir con una máquina para poner los tubos dado que van a 6.50 metros de profundidad el colector, entonces a abrir, tendríamos que comer toda la avenida universidad prácticamente por el talud que tenemos que hacer en protección por la profundidad. Entonces el equipo ya me dice que ya viene en camino, viene de Monterrey, que es el que se va a encargar de por debajo, subterránea, meter las líneas correspondientes de un colector. -----

-C. Deysi Nallely Ángel Hernández. – ¿Alguien más? Bien, pues sí no hay comentarios y agradeciendo el informe arquitecto, le queda mucho tiempo del año. Ahí le encargamos. La verdad es que traemos un gran rezago en la ciudad, históricamente por el crecimiento de Ocotlán, por la parte que corresponde a la irresponsabilidad de quienes fraccionan de manera irregular por todos los servicios que hay que dotar. Es la que vimos en Afamo, ¿se

PÁGINA 10 DE 12

LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027

acuerdan? Se la compramos aquí en la fábrica. Bueno, tendremos que tomar algunas medidas y ponernos bien de acuerdo en lo que tenemos que hacer en lo sucesivo. -----


QUINTO PUNTO: La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del quinto punto del día; presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del quinto punto del día; **ASUNTOS VARIOS**, informo que no existe asunto vario que expresar. -----

SEXTO PUNTO: La C. Deysi Nallely Ángel Hernández; presidenta de la Comisión, procedió al desahogo del sexto punto del día; **CLAUSURA DE LA SESION.** - No habiendo más asuntos que tratar, concluyó **LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA** del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, 2024-2027, siendo las 14:17 catorce horas con diecisiete minutos del 22 de octubre de 2025.-

ATENTAMENTE

22 DE OCTUBRE DE 2025, OCOTLAN, JALISCO

"2025, AÑO DE LA ESCARAMUZA CHARRA EN OCOTLÁN, JALISCO"

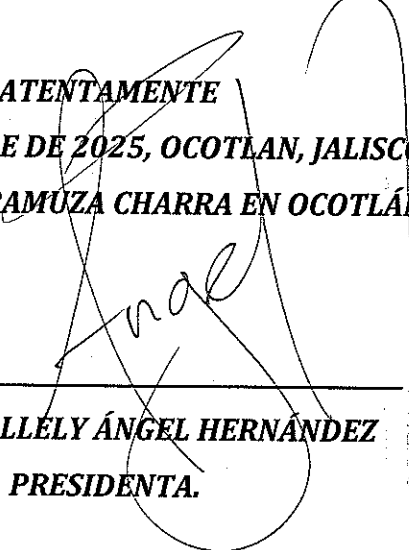

C. DEYSI NALLELY ÁNGEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA.

PÁGINA 11 DE 12

LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027




C. IGNACIO GÓMEZ ORNELAS

VOCAL.



C. ROGELIO GARCIA CASTRO

VOCAL.



C. BERTHA ALICIA CASTELLANOS SALCEDO

VOCAL.



C. EDWIN GILBERTO FONSECA TORRES

VOCAL.

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA DE OBRA PÚBLICA DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025

PÁGINA 12 DE 12
LA PRESENTE FOJA PERTENECE A LA DÉCIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRA PÚBLICA LA CUAL CONSTA DE DOCE FOJAS IMPRESAS POR UNA SOLA CARA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 OCOTLÁN, JALISCO, ADMINISTRACIÓN 2024-2027
