





RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

Mes que se reporta: OCTUBRE - DICIEMBRE

VERSIÓN	Nº DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN	META		UBICACIÓN: MUNICIPIO Y LOCALIDAD	Ubicación		INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	RECURSOS PROGRAMADOS (PESOS)	RETENCIÓN AL MILLAR ASF (PESOS)	RECURSOS TRANSFERIDOS (PESOS)	Modalidad de contratación (LP/CSS/AD/Admón. Directa)	Estatus (Contratado, en proceso o término)	No. De Contrato	Monto contratado	Saldo de contrato (programado vs ejercido)	Avance Físico %	Avance Financiero %
			PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA Y DESCRIPCIÓN		Coordenadas Inicio	Coordenadas Fin											
N/A	1.1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDUSTRIAS, ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, EN LA COLONIA EL PORVENIR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.	256.00	M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	Municipio: Ocotlán Localidad: Ocotlán	20.340641, - 102.768918	20.340663, - 102.764632	Dirección General de Obras Públicas de Ocotlán	102,500.00	102.50	102,397.50	LP	TÉRMINO	UC/021/2025	102,397.50	0.00	100.00	100.00

REPORTE FOTOGRAFICO

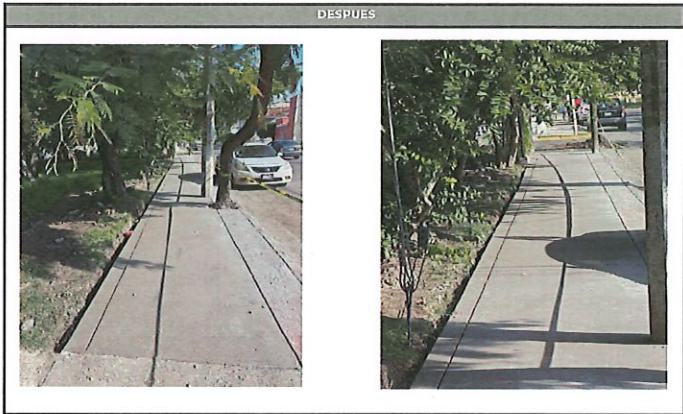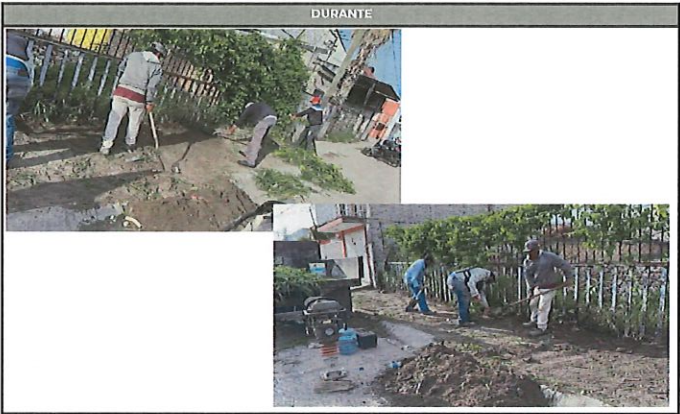

ARQ. SALVADOR ALVIZO LOZANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
